






CONSORCIO






PUENTE



SAMUCO





MHC-LP-OP-001-2021


Bitácora Diaria de Obra del Periodo de Ejecución
del Contrato

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA		 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	
FECHA: 30 DIC 2021 - 03 ENE 2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)		HOJA NÚMERO: 000	
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA		
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ			
PERSONAL EN OBRA					
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1	
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR		CADENERO 2	
ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	I	CELADOR			
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	I	ALMACENISTA			
MAESTRO		AYUDANTES			
OFICIALES		TOPOGRAFO			
ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN					
				A.M.	P.M.
SOLEADO				X	X
SECO					
NUBLADO					
LLUVIA PASAJERA					
LLUVIOSO					
LLUVIA FUERTE					
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL					
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS: X
SEÑALIZACIÓN					
CINTAS REFLECTIVAS: X SEÑALES PREVENTIVAS: X					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS					
<p>SE DA INICIO AL CONTRATO EN REFERENCIA EL DIA 30 DIC DE 2021, SE REVISAN PLANOS Y SE VISITA O HACE EL RECORRIDO AL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ENCONTRANDO QUE LAS POSIBLES VIAS DE ACCESO SE ENCUENTRAN COLAPSADAS, NO PERMITIENDO EL TRANSITO VEHICULAR PARA EL ACOPIO DE LOS MATERIALES.</p> <p>UNA VEZ REALIZADO EL RECORRIDO DE LA VIAS DE ACCESO, SE SOLICITA Y DETERMINA SUSPENDER LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR FUERZA MAYOR, DESDE EL DIA 3 DE ENERO DE 2022.</p>					
 					
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	ACCIDENTES EN OBRA		
VOLQUETAS			OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?		
MEZCLADORAS			SI	No	X
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			HORA:		
MOTOSOLDADOR			NOMBRE:		
PLANTA ELECTRICA			CARGO:		
ELECTROBOMBA			ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:		
MOTOBOMBA			HUBO LESIÓN?		
EXCELENTE: 1	BUENO: 2	DEFICIENTE: 3	SI	No	X
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE INTERVENTORIA </div> </div>					
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM					

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA					
FECHA:		15-21 DE FEBRERO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)		HOJA NÚMERO: 001	
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE				CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA			
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"					
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ					
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.	2	CADENERO 1		X	X
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR		CADENERO 2			
ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	1	CELADOR					
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	1	ALMACENISTA					
MAESTRO		AYUDANTES					
OFICIALES		TOPOGRAFO					
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN	
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
<p>SE DA INICIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN REFERENCIA, CON LAS ACTIVIDADES DE: ALISTAMIENTO, REVISION DE PLANOS, TRANSPORTE DE PERSONAL - MATERIALES Y ACENTAMIENTO EN SITU.</p>							
<p>SE ALLEGA A LA ESCUELA EL REFUGIO LA CUAL SE ENCUENTRA EN LAS RIVERAS DEL CAÑO EL SAMUCO, LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA EL PUENTE HAMACA: PERSONAL DE OBRA COMO , MAESTRO, OFICIAL Y AYUDANTES, COMO TAMBIEN MATERIAL PETREO, ARENA, CEMENTO, ACERO DE REFUERZO Y HERRAMIENTA A UTILIZAR.</p>							
							
							
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA				ACCIDENTES EN OBRA			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?				
VOLQUETAS	2	2	SI				
MEZCLADORAS	1	1					
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO	1	1					
MOTOSOLDADOR	1	1					
PLANTA ELECTRICA	1	1					
ELECTROBOMBA	1	1					
MOTOBOMBA	1	1					
			HUBO LESIÓN?				
			SI				
EXCELENTE: 1			BUENO: 2		DEFICIENTE: 3		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE INTERVENTORIA </div> </div> <p>OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM</p>							

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA				
FECHA:		22 DE FEBRERO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)		HOJA NÚMERO: 002
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE				CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA		
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"				
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ				
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1	1	SOLEADO
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		SECO
ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	1	CELADOR				NUBLADO
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	1	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA
MAESTRO		AYUDANTES				LLUVIOSO
OFICIALES		TOPOGRAFO	1			LLUVIA FUERTE
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X SEÑALES PREVENTIVAS: X
ACTIVIDADES DESARROLLADAS						
<p>SE DA INICIO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN TOPOGRAFICA, SE LOCALIZA EL EJE PRINCIPAL DEL PUENTE, TENIENDO EN CUENTA LA UBICACIÓN DE LA ESCUELA Y DE LA FINCA ALEDAÑA A LOS CIMIENTOS DEL PUENTE.</p> <p>ESTA LOCALIZACIÓN SE REALIZO CON LA AUTORIZACIÓN DE LOS DUEÑOS DE PREDIOS Y REPRESENTANTES DE LA ESCUELA (COMUNIDAD), EN EL LADO DE LA ESCUELA SE TUVO EN CUENTA LA UBICACIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA ESCUELA COMO TAMBIEN DE LA CANCHA DE FUTBOL EXISTENTE PARA NO AFECTAR LAS MISMAS.</p> <p>EN EL COSTADO FRENTE A LA ESCUELA, SE DEFINIO JUNTO CON EL DUEÑO DE LA FINCA QUE SE ENCUENTRA ALEDAÑA AL PUENTE (COSTADO OCCIDENTE)</p>						
						
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLQUETAS			SI	No X		
MEZCLADORAS			HORA:			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			NOMBRE:			
MOTOSOLDADOR			CARGO:			
PLANTA ELECTRICA			ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
ELECTROBOMBA			HUBO LESIÓN?			
MOTOBOMBA			SI	No	X	
EXCELENTE: 1		BUENO: 2		DEFICIENTE: 3		
<p>RESIDENTE DE OBRA</p> <p>RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p> <p>OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM</p>						

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA					
FECHA:		23 DE FEBRERO/2022		LOCALIZACIÓN: Caño EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)		HOJA NÚMERO: 003	
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE				CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA			
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: *CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE*					
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ					
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.		
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1	I	SOLEADO	X
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		SECO	X
ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	I	CELADOR				NUBLADO	
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	I	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA	
MAESTRO	I	AYUDANTES	I			LLUVIOSO	
OFICIALES	I	TOPOGRAFO	I			LLUVIA FUERTE	
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN	
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
<p>SE CONTINUA CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN TOPOGRAFICA, SE LOCALIZAN LAS CIMENTACIONES Y ANCLAJES DEL COSTADO (ORIENTAL, ESCUELA), TENIENDO EN CUENTA LO DEFINIDO POR EL EJE PRINCIPAL.</p>							
<p>SE ESTACAN LOS PUNTOS PRINCIPALES LOCALIZADOS DE LA CIMENTACIÓN (ZAPATAS) Y DEL ANCLAJE PRINCIPAL.</p>							
							
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA	
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?				
VOLQUETAS			SI	No			
MEZCLADORAS			HORA:				
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			NOMBRE:				
MOTOSOLDADOR			CARGO:				
PLANTA ELECTRICA			ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:				
ELECTROBOMBA			HUBO LESIÓN?				
MOTOBOMBA			SI	No			
EXCELENTE: 1		BUENO: 2		DEFICIENTE: 3			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE INTERVENTORIA </div> </div>							
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM							

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA				
FECHA: 24 DE FEBRERO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)			HOJA NÚMERO: 004	
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE				CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA		
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"				
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ				

PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.		A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1	1	SOLEADO	X	X
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		SECO		
ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	1	CELADOR				NUBLADO		
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	1	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA		
MAESTRO	1	AYUDANTES	1			LLUVIOSO		
OFICIALES	1	TOPOGRAFO	1			LLUVIA FUERTE		



ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN	
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X

ACTIVIDADES DESARROLLADAS


SE TERMINA CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REPLANTEO Y LOCALIZACIÓN TOPOGRAFICA, SE LOCALIZAN LAS CIMENTACIONES Y ANCLAJES DEL COSTADO (OCCIDENTAL, FINCA), TENIENDO EN CUENTA LO DEFINIDO POR EL EJE PRINCIPAL.

SE ESTACAN LOS PUNTOS PRINCIPALES LOCALIZADOS DE LA CIMENTACIÓN (ZAPATAS) Y DEL ANCLAJE PRINCIPAL.


SE INICIA CON LAS ACTIVIDADES DE DESCAPOTE A MANO Y RETIRO LATERAL, COSTADO ORIENTAL.

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA			ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?		
VOLQUETAS			SI	No	X
MEZCLADORAS			HORA:		
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			NOMBRE:		
MOTOSOLDADOR			CARGO:		
PLANTA ELECTRICA			ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:		
ELECTROBOMBA			HUBO LESIÓN?	No	X
MOTOBOMBA			SI	No	X
EXCELENTE: 1		BUENO: 2	DEFICIENTE: 3		













RESIDENTE DE OBRA










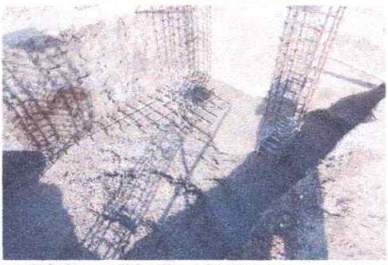


RESIDENTE DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PRESONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA			
FECHA: 25 DE FEBRERO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)		HOJA NÚMERO: 005	
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA		
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: *CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE*			
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ			
PERSONAL EN OBRA					
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1	
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR		CADENERO 2	
ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	I	CELADOR			
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	I	ALMACENISTA			
MAESTRO	I	AYUDANTES	I		
OFICIALES	I	TOPOGRAFO			
ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN					
				A.M.	P.M.
SOLEADO				X	X
SECO					
NUBLADO					
LLUVIA PASAJERA					
LLUVIOSO					
LLUVIA FUERTE					
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL					
CASCO: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS: X
SEÑALIZACIÓN					
CINTAS REFLECTIVAS: X SEÑALES PREVENTIVAS: X					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS					
<p>SE TERMINA CON LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DESCAPOTE A MANO Y RETIRO LATERAL, COSTADO OCCIDENTAL.</p> <p>UNA VEZ SE TIENE ESTACADO EL TERRENO Y TERMINADO SU LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, SE INICIA CON LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN CORRESPONDIENTE A LA CIMENTACIÓN O DONDE SE FUNDIRA LA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, COSTADO ORIENTAL.</p>					
 					
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	ACCIDENTES EN OBRA		
VOLQUETAS			OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?		
MEZCLADORAS			SI	No	X
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			HORA:		
MOTOSOLDADOR			NOMBRE:		
PLANTA ELECTRICA			CARGO:		
ELECTROBOMBA			ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:		
MOTOBOMBA			HUBO LESIÓN?		
EXCELENTE: 1			SI	No	X
BUENO: 2					
DEFICIENTE: 3					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE INTERVENTORIA </div> </div>					
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM					

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA					
FECHA:		26 DE FEBRERO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)		HOJA NÚMERO: 006	
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE				CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA			
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"					
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ					
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.		
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO	X
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		SECO	X
ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	I	CELADOR				NUBLADO	
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	I	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA	
MAESTRO	I	AYUDANTES	I			LLUVIOSO	
OFICIALES	I	TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE	
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN	
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
<p>SE TERMINA CON LA EXCAVACIÓN PARA CIMENTACION, ZAPATA PARTE ORIENTAL, SE INICIA CON LA EXCAVACIÓN PARA EL ANCLAJE ZONA ORIENTAL.</p>							
							
							
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA	
DESCRIPCIÓN		CANT.	ESTADO		OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?		
VOLQUETAS					SI	No	X
MEZCLADORAS					HORA:		
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO					NOMBRE:		
MOTOSOLDADOR					CARGO:		
PLANTA ELECTRICA					ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:		
ELECTROBOMBA					HUBO LESIÓN?	No	X
MOTOBOMBA					SI	No	X
EXCELENTE: 1		BUENO: 2	DEFICIENTE: 3				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE INTERVENTORIA </div> </div> <p>OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM</p>							

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA					
FECHA: 28 DE FEBRERO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)			HOJA NÚMERO: 007		
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE				CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA			
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: *CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE*					
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ					
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	SOLEADO	A.M. X P.M. X
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SECO	
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		NUBLADO	
ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	I	CELADOR				LLUVIA PASAJERA	
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	I	ALMACENISTA				LLUVIOSO	
MAESTRO	I	AYUDANTES	I			LLUVIA FUERTE	
OFICIALES	I	TOPOGRAFO					
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN	
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
<p>SE TERMINA CON LA EXCAVACIÓN PARA EL ANCLAJE ZONA ORIENTAL, SE INICIA EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS ZONA OCCIDENTAL.</p> <p>SE FUNDE CONCRETO PARA SOLADO DE ZAPATAS ZONA ORIENTAL</p>							
 							
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA	
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?				
VOLQUETAS			SI	No X			
MEZCLADORAS			HORA:				
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			NOMBRE:				
MOTOSOLDADOR			CARGO:				
PLANTA ELECTRICA			ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:				
ELECTROBOMBA			HUBO LESIÓN?				
MOTOBOMBA			SI	No X			
EXCELENTE: I		BUENO: 2		DEFICIENTE: 3			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE INTERVENTORIA </div> </div> <p>OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM</p>							

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA					
FECHA:		01 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)		HOJA NÚMERO: 008	
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE				CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA			
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: *CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE*					
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ					
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.		
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO	A.M. X P.M. X
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		SECO	
ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	1	CELADOR				NUBLADO	
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	1	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA	
MAESTRO	1	AYUDANTES	5			LLUVIOSO	
OFICIALES	1	TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE	
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN	
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
<p>SE TERMINA CON LA EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS ZONA OCCIDENTAL, SE INICIA EXCAVACIÓN PARA ANCLAJES ZONA OCCIDENTAL.</p> <p>SE FUNDE CONCRETO PARA SOLADO DE ANCLAJES ZONA ORIENTAL</p> <p>SE CONTINUA CON EL CORTE DE LEMENTOS DEL ACERO DE REFUERZO</p>							
 							
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA	
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?				
VOLQUETAS			Si No X				
MEZCLADORAS	1	1	HORA:				
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO	1	1	NOMBRE:				
MOTOSOLDADOR			CARGO:				
PLANTA ELECTRICA			ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:				
ELECTROBOMBA	1	2	HUBO LESIÓN?				
MOTOBOMBA			Si No X				
EXCELENTE: 1		BUENO: 2		DEFICIENTE: 3			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE INTERVENTORIA </div> </div>							
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM							

CONSORCIO PUENTE SAMUCO -
NIT: 901548350-4

DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL
CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA



FECHA:

02 DE MARZO/2022

LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)

HOJA NÚMERO: 009

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ;
R/L WILFREDO BRACA ZEA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-
204 DEL 14 DICIEMBRE 2021

OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO
DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

INTERVENTORIA:

SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ

PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.		A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO	X	X
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		SECO		
ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	1	CELADOR				NUBLADO		
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	1	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA		
MAESTRO	1	AYUDANTES	5			LLUVIOSO		
OFICIALES	1	TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE TERMINA CON LA EXCAVACIÓN PARA ANCLAJES ZONA OCCIDENTAL.



SE FUNDE CONCRETO PARA SOLADO PARA ZAPATAS ZONA OCCIDENTAL

SE CONTINUA CON EL CORTE DE ELEMENTOS Y FIGURACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO







MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA			ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?		
VOLQUETAS			SI	No	X
MEZCLADORAS	1	1	HORA:		
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO	1	1	NOMBRE:		
MOTOSOLDADOR			CARGO:		
PLANTA ELECTRICA	1	1	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:		
ELECTROBOMBA	1	2	HUBO LESIÓN?		
MOTOBOMBA			SI	No	X
EXCELENTE: 1			BUENO: 2		
			DEFICIENTE: 3		





RESIDENTE DE OBRA





RESIDENTE DE INTERVENTORIA


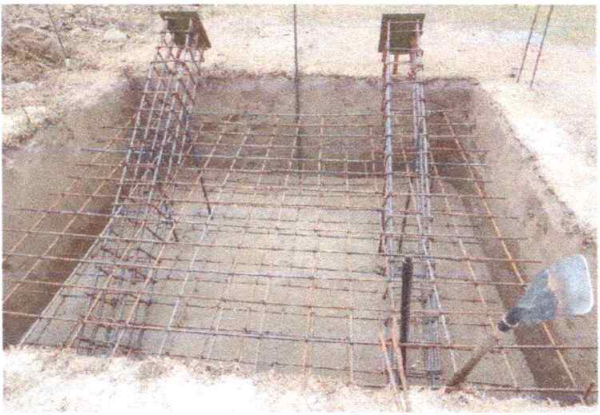


OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA						
FECHA:		03 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)		HOJA NÚMERO: 010		
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE				CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA				
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04- 204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"						
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ						
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.		A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO	X	X
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		SECO		
ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	I	CELADOR				NUBLADO		
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	I	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA		
MAESTRO	I	AYUDANTES	5			LLUVIOSO		
OFICIALES	I	TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS								
SE CONTINUA CON LA FIGURACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO								
SE FUNDE CONCRETO PARA SOLADO DE ANCLAJE ZONA OCCIDENTAL								
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?					
VOLQUETAS			SI			No	X	
MEZCLADORAS	I	I	HORA:					
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO	I	I	NOMBRE:					
MOTOSOLDADOR			CARGO:					
PLANTA ELECTRICA	I	I	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:					
ELECTROBOMBA	I	2	HUBO LESIÓN?					
MOTOBOMBA			SI			No	X	
EXCELENTE: I		BUENO: 2		DEFICIENTE: 3				
RESIDENTE DE OBRA								
RESIDENTE DE INTERVENTORIA								
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM								

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA <i>BITACORA DIARIA DE OBRA</i>					
FECHA:		04 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)		HOJA NÚMERO: 011	
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE				CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA			
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"					
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ					
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	SOLEADO	A.M. / P.M.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SECO	X / X
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		NUBLADO	
ING. DIRECTOR INTERVENTORIA	1	CELADOR				LLUVIA PASAJERA	
ING. RESIDENTE INTERVENTORIA	1	ALMACENISTA				LLUVIOSO	
MAESTRO	1	AYUDANTES	5			LLUVIA FUERTE	
OFICIALES	1	TOPOGRAFO					
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN	
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
<p>SE CONTINUA CON LA FIGURACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="width: 45%; border-bottom: 1px dotted black; height: 150px;"></div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  </div> </div>							
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA				ACCIDENTES EN OBRA			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?				
VOLQUETAS			SI	No / X			
MEZCLADORAS			HORA:				
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			NOMBRE:				
MOTOSOLDADOR			CARGO:				
PLANTA ELECTRICA	1	1	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:				
ELECTROBOMBA			HUBO LESIÓN?				
MOTOBOMBA			SI	No / X			
EXCELENTE: 1		BUENO: 2		DEFICIENTE: 3			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">  RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  RESIDENTE DE INTERVENTORIA </div> </div> <p>OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM</p>							

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA			
FECHA: 05 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)		HOJA NÚMERO: 012	
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA		
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ			
PERSONAL EN OBRA					
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1	
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR		CADENERO 2	
ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR			
ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA			
MAESTRO	I	AYUDANTES	5		
OFICIALES	I	TOPOGRAFO			
ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN					
				A.M.	P.M.
SOLEADO				X	X
SECO					
NUBLADO					
LLUVIA PASAJERA					
LLUVIOSO					
LLUVIA FUERTE					
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL					
CASCO: X		BOTAS: X		GUANTES: X	
		GAFAS: X		CARNÉ: X	
				CONOS: X	
				CINTAS REFLECTIVAS: X	
				SEÑALES PREVENTIVAS: X	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS					
<p>SE CONTINUA CON LA FIGURACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO</p> <p>SE INICIA CON LA INSTALACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTOS EN ZAPATAS ZONA ORIENTAL</p>					
					
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO			
VOLQUETAS			SI		
MEZCLADORAS			HORA:		
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			NOMBRE:		
MOTOSOLDADOR			CARGO:		
PLANTA ELECTRICA	I	I	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:		
ELECTROBOMBA			HUBO LESIÓN?		
MOTOBOMBA			SI		
EXCELENTE: I		BUENO: 2		DEFICIENTE: 3	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE INTERVENTORIA </div> </div>					
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM					

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA				
FECHA: 07 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)		HOJA NÚMERO: 013		
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA			
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"				
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ				
PERSONAL EN OBRA						
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		
ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				
ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				
MAESTRO	I	AYUDANTES	5			
OFICIALES	I	TOPOGRAFO				
ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN						
				A.M.	P.M.	
SOLEADO				X	X	
SECO						
NUBLADO						
LLUVIA PASAJERA						
LLUVIOSO						
LLUVIA FUERTE						
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						
CASCO: X		BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	
SEÑALIZACIÓN						
CINTAS REFLECTIVAS: X		SEÑALES PREVENTIVAS: X				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS						
<p>YA INSTALADO EL REFUERZO PARA ZAPATAS Y COLUMNAS, SE FUNDE LA ZAPATA DE CIMENTACIÓN EN EL COSTADO ZONA ORIENTAL, EN CONCRETO DE 3000 PSI.</p>						
						
<p>SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO (CILINDROS) PARA SU VERIFICACIÓN EN CUANTO A LA RESISTENCIA, PARA POSTERIOR LLEVAR A LABORATORIO Y PROCEDER A ROTURA.</p>						
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	ACCIDENTES EN OBRA			
VOLQUETAS			OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
MEZCLADORAS	I	I	SI	No	X	
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO	I	I	HORA:			
MOTOSOLDADOR			NOMBRE:			
PLANTA ELECTRICA	I	I	CARGO:			
ELECTROBOMBA	I	2	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
MOTOBOMBA			HUBO LESIÓN?			
EXCELENTE: I		BUENO: 2	DEFICIENTE: 3	SI	No	X
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE INTERVENTORIA </div> </div>						
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM						

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA						
FECHA: 08 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)		HOJA NÚMERO: 014				
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA					
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"						
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ						
PERSONAL EN OBRA								
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
						SOLEADO	A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SECO	X	X
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		NUBLADO		
ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				LLUVIA PASAJERA		
ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				LLUVIOSO		
MAESTRO	I	AYUDANTES	5			LLUVIA FUERTE		
OFICIALES	I	TOPOGRAFO						
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS								
<p>YA CORTADO LOS ELEMENTOS PARA REFUERZO EN ACERO, Y POSTERIOR ARMADO DE PARRILLAS Y CANASTAS, SE PROCEDE A INSTALAR EN SITU DEL ANCLEJE. ZONA ORIENTAL</p>								
								
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA								
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	ACCIDENTES EN OBRA					
			OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?					
VOLQUETAS			SI	No	X			
MEZCLADORAS			HORA:					
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			NOMBRE:					
MOTOSOLDADOR			CARGO:					
PLANTA ELECTRICA	I	I	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:					
ELECTROBOMBA			HUBO LESIÓN?					
MOTOBOMBA			SI	No	X			
EXCELENTE: I		BUENO: 2	DEFICIENTE: 3					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE INTERVENTORIA </div> </div>								
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM								

CONSORCIO PUENTE SAMUCO -
NIT: 901548350-4

DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL
CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA



FECHA: 09 DE MARZO/2022 LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO) HOJA NÚMERO: 015

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021 OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

INTERVENTORIA: SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ

PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.		A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO	X	X
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		SECO		
ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				NUBLADO		
ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA		
MAESTRO	I	AYUDANTES	5			LLUVIOSO		
OFICIALES	I	TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

YA CORTADO LOS ELEMENTOS PARA REFUERZO EN ACERO, Y POSTERIOR ARMADO DE PARRILLAS Y CANASTAS, SE PROCEDE A INSTALAR EN SITU DE LAS COLUMNAS. ZONA ORIENTAL











MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA			ACCIDENTES EN OBRA			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLQUETAS			SI	No	X	
MEZCLADORAS			HORA:			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			NOMBRE:			
MOTOSOLDADOR			CARGO:			
PLANTA ELECTRICA	I	I	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
ELECTROBOMBA			HUBO LESIÓN?			
MOTOBOMBA			SI	No	X	
EXCELENTE: I			BUENO: 2		DEFICIENTE: 3	

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA				 HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE	
FECHA:		10 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)		HOJA NÚMERO: 016	
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE				CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA			
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: *CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE*					
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ					
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO	X
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		SECO	X
ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				NUBLADO	
ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA	
MAESTRO	I	AYUDANTES	5			LLUVIOSO	
OFICIALES	I	TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE	
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN	
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
<p>UNA VEZ INSTALADO EL ACERO DE REFUERZO EN SITU DEL ANCLAJE EN ZONA ORIENTAL, SE PROCEDE A FUNDIR EN CONCRETO D E3000 PSI, ADICIONALMENTE SE TOMAN MUESTRAS (CILINDROS) PARA TESTIGOS DE LAS RESISTENCIAS, ESTAS SE LLEVAN AL LABORATORIO PARA HACER EL PROCESO RESPECTIVO</p> <p>EN EL ACERO DE REFUERZO, SE INSTALAS LOS ELEMENTOS METALICOS, PLATINAS Y FIGURA PARA EL SOPORTE DE GUAYAS PRINCIPALES AL ANCAJE.</p>							
							
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA				ACCIDENTES EN OBRA			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?				
VOLQUETAS			SI	No			
MEZCLADORAS			HORA:				
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			NOMBRE:				
MOTOSOLDADOR			CARGO:				
PLANTA ELECTRICA	I	I	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:				
ELECTROBOMBA			HUBO LESIÓN?				
MOTOBOMBA			SI	No			
EXCELENTE: I		BUENO: 2		DEFICIENTE: 3			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE INTERVENTORIA </div> </div>							
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM							

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA				
FECHA: 11 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)			HOJA NÚMERO: 017	
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE				CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA		
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: *CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE*				
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ				
PERSONAL EN OBRA						
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR		CADENERO 2		SECO
ING. DIRECTOR INTERVENT	1	CELADOR				NUBLADO
ING. RESIDENTE INTERVENT	1	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA
MAESTRO	1	AYUDANTES	5			LLUVIOSO
OFICIALES	1	TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X
SEÑALIZACIÓN						
SEÑALES PREVENTIVAS: X						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS						
<p>SE MONTAN O ARMAN CANASTAS ACERO EN COLUMNAS ZONAS ORIENTAL.</p>						
						
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	ACCIDENTES EN OBRA			
VOLQUETAS			OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
MEZCLADORAS			SI	No		
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			HORA:			
MOTOSOLDADOR			NOMBRE:			
PLANTA ELECTRICA	1	1	CARGO:			
ELECTROBOMBA			ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
MOTOBOMBA			HUBO LESIÓN?			
EXCELENTE: 1			BUENO: 2	DEFICIENTE: 3		
 RESIDENTE DE OBRA			 RESIDENTE DE INTERVENTORIA			
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM						

CONSORCIO PUENTE SAMUCO -
NIT: 901548350-4

DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL
CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA



FECHA: 12 DE MARZO/2022 LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO) HOJA NÚMERO: 018

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ;
R/L WILFREDO BRACA ZEA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-
204 DEL 14 DICIEMBRE 2021

OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO
DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

INTERVENTORIA:

SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ

PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.		A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO	X	X
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR	1	CADENERO 2		SECO		
ING. DIRECTOR INTERVENT	1	CELADOR				NUBLADO		
ING. RESIDENTE INTERVENT	1	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA		
MAESTRO	1	AYUDANTES	5			LLUVIOSO		
OFICIALES	1	TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE TERMINA DE ARMAR O MONTAN CANASTAS ACERO EN COLUMNAS ZONAS ORIENTAL.

SE FUNDEN COLUMNAS ZONA ORIENTAL, CONCRETO 3000 PSI, SE TOMAN MUESTRAS PARA
TESTIGOS DE RESISTENCIA, PARA POSTERIORMENTE LLEVAR A LABORATORIO.

SE INSTALAN LAS ESTRUCTURAS SOPORTES PARA TORRES, INCLUYE PLATINAS Y
TORNILLERIA, ESTAS VAN AL FINAL DE LA COLUMNA.

SE INICIA CON LOS CORTES DE LA TUBERIA 6" PARA LAS TORRES PRINCIPALES



MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA			ACCIDENTES EN OBRA			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLQUETAS			SI		No	X
MEZCLADORAS	1	1	HORA:			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO	1	1	NOMBRE:			
MOTOSOLDADOR			CARGO:			
PLANTA ELECTRICA	1	1	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
ELECTROBOMBA	1	2	HUBO LESIÓN?		No	X
MOTOBOMBA			SI			
EXCELENTE: 1		BUENO: 2	DEFICIENTE: 3			

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM

CONSORCIO PUENTE SAMUCO -
NIT: 901548350-4

DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL
CONTROL DE OBRA
BITACORA DIARIA DE OBRA



FECHA: 14 DE MARZO/2022 LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO) HOJA NÚMERO: 019

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ;
R/L WILFREDO BRACA ZEA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-
204 DEL 14 DICIEMBRE 2021

OBJETO: *CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO
DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE*

INTERVENTORIA:

SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ

PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.		A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO	X	X
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR	1	CADENERO 2		SECO		
ING. DIRECTOR INTERVENT	1	CELADOR				NUBLADO		
ING. RESIDENTE INTERVENT	1	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA		
MAESTRO	1	AYUDANTES	5			LLUVIOSO		
OFICIALES	1	TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN		
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE TERMINA DE ARMAR O MONTAN PARRILLAS ACERO EN ZAPATAS ZONAS OCCIDENTAL.

SE FUNDEN ZAPATA ZONA OCCIDENTAL. CONCRETO 3000 PSI, SE TOMAN MUESTRAS PARA
TESTIGOS DE RESISTENCIA, PARA POSTERIORMENTE LLEVAR A LABORATORIO.

SE INICIA CON EL CORTE DE LEMENTOS PARA ESTRUCTURTA LONGITUDINAL TIBERIA 3" Y 2
Y 1/2" Y ANGULOS DE METALICOS

SE CONTINUA CON LOS CORTES DE LA TUBERIA 6" PARA LAS TORRES PRINCIPALES




MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA			ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?		
VOLQUETAS			SI	No	X
MEZCLADORAS	1	1	HORA:		
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO	1	1	NOMBRE:		
MOTOSOLDADOR			CARGO:		
PLANTA ELECTRICA	1	1	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:		
ELECTROBOMBA	1	2	HUBO LESIÓN?		
MOTOBOMBA			SI	No	X
EXCELENTE: 1			BUENO: 2		
			DEFICIENTE: 3		

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4	DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA	
FECHA:	15 DE MARZO/2022	LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE		CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021	OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"	
INTERVENTORIA:	SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ	

PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	ESTADO	A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO	X	X
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR	1	CADENERO 2		SECO		
ING. DIRECTOR INTERVENT	1	CELADOR				NUBLADO		
ING. RESIDENTE INTERVENT	1	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA		
MAESTRO	1	AYUDANTES	5			LLUVIOSO		
OFICIALES	1	TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE		

ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN	
CASCO: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE TERMINA DE ARMAR O MONTAN CANASTAS COLUMNAS ORIENTALES, JUNTO CON LAS PESTRUCTURA SOPORTES DE TORRES (PLATINAS Y TORNILLERIA).


SE FUNDEN COLUMNAS ZONA ORIENTAL, CONCRETO 3000 PSI, SE TOMAN MUESTRAS PARA TESTIGOS DE RESISTENCIA, PARA POSTERIORMENTE LLEVAR A LABORATORIO.

SE CONTINUA CON EL CORTE DE LEMENTOS PARA ESTRUCTURTA LONGITUDINAL TIBERIA 3" Y 2 Y 1/2" Y ANGULOS DE METALICOS


SE CONTINUA CON LOS CORTES DE LA TUBERIA 6" PARA LAS TORRES PRINCIPALES

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA			ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?		
VOLQUETAS			SI	No	X
MEZCLADORAS	1	1	HORA:		
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO	1	1	NOMBRE:		
MOTOSOLDADOR			CARGO:		
PLANTA ELECTRICA	1	1	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:		
ELECTROBOMBA	1	2	HUBO LESIÓN?		
MOTOBOMBA			SI	No	X
EXCELENTE: 1		BUENO: 2	DEFICIENTE: 3		




RESIDENTE DE OBRA



RESIDENTE DE INTERVENTORIA

OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4	DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA	
FECHA:	16 DE MARZO/2022	LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE		CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021	OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"	
INTERVENTORIA:	SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ	

PERSONAL EN OBRA				ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR	1	CADENERO 2		SECO
ING. DIRECTOR INTERVENT	1	CELADOR				NUBLADO
ING. RESIDENTE INTERVENT	1	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA
MAESTRO	1	AYUDANTES	5			LLUVIOSO
OFICIALES	1	TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE

ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN	
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X



ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE TERMINA DE ARMAR O MONTAN CANASTAS PARA ANCLAJES OCCIDENTALES, INCLUYE EL SOPORTE PARA LAS GUAYAS PRINCIPALES (METALICO).


SE FUNDEN ANCLAJE ZONA OCCIDENTAL, CONCRETO 3000 PSI, SE TOMAN MUESTRAS PARA TESTIGOS DE RESISTENCIA, PARA POSTERIORMENTE LLEVAR A LABORATORIO.

SE CONTINUA CON EL CORTE DE LEMENTOS PARA ESTRUCTURTA LONGITUDINAL TIBERIA 3" Y 2 Y 1/2" Y ANGULOS DE METALICOS


SE CONTINUA CON LOS CORTES DE LA TUBERIA 6" PARA LAS TORRES PRINCIPALES

MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA			ACCIDENTES EN OBRA		
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?		
VOLQUETAS			SI	No	X
MEZCLADORAS	1	1	HORA:		
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO	1	1	NOMBRE:		
MOTOSOLDADOR			CARGO:		
PLANTA ELECTRICA	1	1	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:		
ELECTROBOMBA	1	2	HUBO LESIÓN?	No	X
MOTOBOMBA			SI	No	X
EXCELENTE: 1 BUENO: 2 DEFICIENTE: 3					











RESIDENTE DE OBRA











RESIDENTE DE INTERVENTORIA






OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PRESONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM






CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA					
FECHA:		17 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)		HOJA NÚMERO: 022	
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE				CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA			
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: *CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE*					
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ					
PERSONAL EN OBRA							
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO	X
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR	1	CADENERO 2		SECO	X
ING. DIRECTOR INTERVENT	1	CELADOR				NUBLADO	
ING. RESIDENTE INTERVENT	1	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA	
MAESTRO	1	AYUDANTES	5			LLUVIOSO	
OFICIALES	1	TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE	
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL							
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X
SEÑALIZACIÓN							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
<p>SE TERMINA DE ARMAR O MONTAN CANASTAS PARA COLUMNAS OCCIDENTAL. INCLUYE</p> <p>SE FUNDEN COLUMNAS ZONA OCCIDENTAL. CONCRETO 3000 PSI, SE TOMAN MUESTRAS PARA TESTIGOS DE RESISTENCIA, PARA POSTERIORMENTE LLEVAR A LABORATORIO.</p> <p>SE CONTINUA CON EL CORTE DE LEMENTOS PARA ESTRUCTURTA LONGITUDINAL TIBERIA 3" Y 2 Y 1/2" Y ANGULOS DE METALICOS</p> <p>SE CONTINUA CON LOS CORTES DE LA TUBERIA 6" PARA LAS TORRES PRINCIPALES</p>							
							
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA							
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	ACCIDENTES EN OBRA				
VOLQUETAS			OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?				
MEZCLADORAS	1	1	SI	No			X
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO	1	1	HORA:				
MOTOSOLDADOR			NOMBRE:				
PLANTA ELECTRICA	1	1	CARGO:				
ELECTROBOMBA	1	2	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:				
MOTOBOMBA			HUBO LESIÓN?				
			SI	No			X
EXCELENTE: 1		BUENO: 2		DEFICIENTE: 3			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE INTERVENTORIA </div> </div> <p>OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM</p>							


CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA				
FECHA:		18 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)		HOJA NÚMERO: 023
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE				CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA		
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: *CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE*				
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ				
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR	I	CADENERO 2		SECO
ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				NUBLADO
ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA
MAESTRO	I	AYUDANTES	5			LLUVIOSO
OFICIALES	I	TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X
						SEÑALES PREVENTIVAS: X
ACTIVIDADES DESARROLLADAS						
<p>SE TERMINA DE ARMAR O MONTAN CANASTAS PARA COLUMNAS OCCIDENTAL.</p>						
<p>SE FUNDEN COLUMNAS ZONA OCCIDENTAL, CONCRETO 3000 PSI. SE TOMAN MUESTRAS PARA TESTIGOS DE RESISTENCIA, PARA POSTERIORMENTE LLEVAR A LABORATORIO.</p>						
<p>SE CONTINUA CON EL CORTE DE LEMENTOS PARA ESTRUCTURTA LONGITUDINAL TIBERIA 3" Y 2 Y 1/2" Y ANGULOS DE METALICOS</p>						
<p>SE CONTINUA CON LOS CORTES DE LA TUBERIA 6" PARA LAS TORRES PRINCIPALES</p>						
						
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA			ACCIDENTES EN OBRA			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOQUETAS			SI	No		
MEZCLADORAS	I	I	HORA:			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO	I	I	NOMBRE:			
MOTOSOLDADOR			CARGO:			
PLANTA ELECTRICA	I	I	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
ELECTROBOMBA	I	2	HUBO LESIÓN?			
MOTOBOMBA			SI	No		
EXCELENTE: I		BUENO: 2	DEFICIENTE: 3			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE INTERVENTORIA </div> </div>						
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PRESONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM						

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA					
FECHA:		19 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)		HOJA NÚMERO: 024	
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE				CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA			
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"					
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ					
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO	X
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR	I	CADENERO 2		SECO	X
ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				NUBLADO	
ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA	
MAESTRO	I	AYUDANTES	3			LLUVIOSO	
OFICIALES	I	TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE	
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN	
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
<p>SE TERMINA DE ARMAR O MONTAN CANASTAS PARA VIGAS ORIENTALES</p> <p>SE FUNDEN VIGAS ZONA ORIENTAL, CONCRETO 3000 PSI, SE TOMAN MUESTRAS PARA TESTIGOS DE RESISTENCIA, PARA POSTERIORMENTE LLEVAR A LABORATORIO.</p> <p>SE INICIA ARMANDO LAS ESTRUCTURAS DE LA ATORRE PRINCIPAL ZONA ORIENTAL CON LOS ELEMENTOS PARA LA ESTRUCTURTA, TAMBIEN SE INICIA ARMANDO LOS MODULOS LONGITUDINALES TUBERIA 3" Y 2 Y 1/2" Y ANGULOS DE METALICOS.</p>							
							
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA				ACCIDENTES EN OBRA			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	Ocurrió ALGÚN ACCIDENTE?				
VOLQUETAS			SI	No			
MEZCLADORAS	I	I	HORA:				
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO	I	I	NOMBRE:				
MOTOSOLDADOR			CARGO:				
PLANTA ELECTRICA	I	I	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:				
ELECTROBOMBA	I	2	HUBO LESIÓN?				
MOTOBOMBA			SI	No			
EXCELENTE: 1		BUENO: 2		DEFICIENTE: 3			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE INTERVENTORIA </div> </div> <p>OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM</p>							

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA					
FECHA:		21 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)		HOJA NÚMERO: 025	
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE				CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA			
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"					
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ					
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.		
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO	X
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR	1	CADENERO 2		SECO	X
ING. DIRECTOR INTERVENT	1	CELADOR				NUBLADO	
ING. RESIDENTE INTERVENT	1	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA	
MAESTRO	1	AYUDANTES	3			LLUVIOSO	
OFICIALES	1	TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE	
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN	
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
<p>SE TERMINA DE ARMAR O MONTAN CANASTAS PARA VIGAS OCCIDENTALES</p> <hr/> <p>SE FUNDEN VIGAS ZONA OCCIDENTAL, CONCRETO 3000 PSI, SE TOMAN MUESTRAS PARA TESTIGOS DE RESISTENCIA, PARA POSTERIORMENTE LLEVAR A LABORATORIO.</p> <hr/> <p>SE CONTINUA ARMANDO LAS ESTRUCTURAS DE LA ATORRE PRINCIPAL ZONA ORIENTAL CON LOS ELEMENTOS PARA LA ESTRUCTURA, TAMBIEN SE INICIA ARMANDO LOS MODULOS LONGITUDINALES TUBERIA 3" Y 2 Y 1/2" Y ANGULOS DE METALICOS.</p> <hr/> <p>SE INICIA CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO, SE TIENE DISPONIBILIDAD DE GUAYA PRINCIPAL, GUAYA TENSORA, PENDOLONES, PERNOS PARA GUAYAS.</p> <hr/>							
							
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA	
DESCRIPCIÓN		CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLQUETAS				SI	No		
MEZCLADORAS		1	1	HORA:			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO		1	1	NOMBRE:			
MOTOSOLDADOR				CARGO:			
PLANTA ELECTRICA		1	1	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
ELECTROBOMBA		1	2	HUBO LESIÓN?			
MOTOBOMBA				SI	No		
EXCELENTE: 1		BUENO: 2		DEFICIENTE: 3			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE INTERVENTORIA </div> </div>							
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM							

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA					
FECHA: 22 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)			HOJA NÚMERO: 026		
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE				CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA			
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"					
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ					
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	SOLEADO	A.M.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SECO	X
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR	1	CADENERO 2		NUBLADO	
ING. DIRECTOR INTERVENT	1	CELADOR				LLUVIA PASAJERA	
ING. RESIDENTE INTERVENT	1	ALMACENISTA				LLUVIOSO	
MAESTRO		AYUDANTES	3			LLUVIA FUERTE	
OFICIALES		TOPOGRAFO					
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN	
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
<p>SE CONTINUA ARMANDO LAS ESTRUCTURAS DE LA ATORRE PRINCIPAL ZONA ORIENTAL CON LOS ELEMENTOS PARA LA ESTRUCTURTA, TAMBIEN SE INICIA ARMANDO LOS MODULOS LONGITUDINALES TUBERIA 3" Y 2 Y 1/2" Y ANGULOS DE METALICOS.</p>							
 							
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA	
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?				
VOLQUETAS			SI No X				
MEZCLADORAS			HORA:				
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			NOMBRE:				
MOTOSOLDADOR	1	1	CARGO:				
PLANTA ELECTRICA	1	1	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:				
ELECTROBOMBA			HUBO LESIÓN?				
MOTOBOMBA			SI No X				
EXCELENTE: 1		BUENO: 2		DEFICIENTE: 3			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE INTERVENTORIA </div> </div> <p>OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM</p>							



CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA <i>BITACORA DIARIA DE OBRA</i>					
FECHA:		23 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)		HOJA NÚMERO: 027	
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE				CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA			
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"					
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ					
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.		
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO	X
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR	I	CADENERO 2		SECO	
ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				NUBLADO	
ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA	
MAESTRO		AYUDANTES	3			LLUVIOSO	
OFICIALES		TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE	
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN	
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
<p>SE CONTINUA ARMANDO LAS ESTRUCTURAS DE LA ATORRE PRINCIPAL ZONA ORIENTAL CON LOS ELEMENTOS PARA LA ESTRUCTURTA, TAMBIEN SE INICIA ARMANDO LOS MODULOS LONGITUDINALES TUBERIA 3" Y 2 Y 1/2" Y ANGULOS DE METALICOS.</p>							
							
							
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA	
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?				
VOLQUETAS			SI NO X				
MEZCLADORAS			HORA:				
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			NOMBRE:				
MOTOSOLDADOR	I	I	CARGO:				
PLANTA ELECTRICA	I	I	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:				
ELECTROBOMBA			HUBO LESIÓN?				
MOTOBOMBA			SI NO X				
EXCELENTE: I		BUENO: 2		DEFICIENTE: 3			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE INTERVENTORIA </div> </div> <p>OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM</p>							

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4	DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA	
FECHA:	24 DE MARZO/2022	LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE		CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021	OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"	
INTERVENTORIA:	SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ	


PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN		
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	SOLEADO	A.M.	P.M.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SECO	X	X
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR	I	CADENERO 2		NUBLADO		
ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				LLUVIA PASAJERA		
ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				LLUVIOSO		
MAESTRO		AYUDANTES	3			LLUVIA FUERTE		
OFICIALES		TOPOGRAFO						


ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN	
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
<p>SE CONTINUA ARMANDO LAS ESTRUCTURAS DE LA ATORRE PRINCIPAL ZONA ORIENTAL CON LOS ELEMENTOS PARA LA ESTRUCTURTA, TAMBIEN SE INICIA ARMANDO LOS MODULOS LONGITUDINALES TUBERIA 3" Y 2 Y 1/2" Y ANGULOS DE METALICOS.</p> <p>SE MONTAN GALAPAGOS</p>












MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA				ACCIDENTES EN OBRA			
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO		OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLQUETAS				SI		No	X
MEZCLADORAS				HORA:			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO				NOMBRE:			
MOTOSOLDADOR	I	I		CARGO:			
PLANTA ELECTRICA	I	I		ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
ELECTROBOMBA				HUBO LESIÓN?			
MOTOBOMBA				SI		No	X
EXCELENTE: I		BUENO: 2		DEFICIENTE: 3			





RESIDENTE DE OBRA


RESIDENTE DE INTERVENTORIA





OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM





CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA					
FECHA:		25 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)		HOJA NÚMERO: 029	
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE				CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA			
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"					
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ					
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.		
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO	X
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR	I	CADENERO 2		SECO	X
ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				NUBLADO	
ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA	
MAESTRO		AYUDANTES	3			LLUVIOSO	
OFICIALES		TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE	
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN	
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
<p>SE CONTINUA ARMANDO LAS ESTRUCTURAS DE LA ATORRE PRINCIPAL ZONA ORIENTAL CON LOS ELEMENTOS PARA LA ESTRUCTURTA, TAMBIEN SE INICIA ARMANDO LOS MODULOS LONGITUDINALES TUBERIA 3" Y 2 Y 1/2" Y ANGULOS DE METALICOS.</p>							
							
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA	
DESCRIPCIÓN		CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLQUETAS				SI	No		
MEZCLADORAS				HORA:			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO				NOMBRE:			
MOTOSOLDADOR		I	I	CARGO:			
PLANTA ELECTRICA		I	I	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
ELECTROBOMBA				HUBO LESIÓN?			
MOTOBOMBA				SI	No		
EXCELENTE: I		BUENO: 2		DEFICIENTE: 3			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE INTERVENTORIA </div> </div> <p>OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM</p>							

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA					
FECHA: 26 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)				HOJA NÚMERO: 030	
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE				CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA			
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"					
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ					
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.		
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO	X
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR	I	CADENERO 2		SECO	
ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				NUBLADO	
ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA	
MAESTRO		AYUDANTES	3			LLUVIOSO	
OFICIALES		TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE	
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN	
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
<p>SE CONTINUA ARMANDO LAS ESTRUCTURAS DE LA ATORRE PRINCIPAL ZONA OCCIDENTAL CON LOS ELEMENTOS PARA LA ESTRUCTURTA, TAMBIEN SE INICIA ARMANDO LOS MODULOS LONGITUDINALES TUBERIA 3" Y 2 Y 1/2" Y ANGULOS DE METALICOS.</p>							
							
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA	
DESCRIPCIÓN			CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?		
VOLQUETAS					SI	No	X
MEZCLADORAS					HORA:		
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO					NOMBRE:		
MOTOSOLDADOR			I	I	CARGO:		
PLANTA ELECTRICA			I	I	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:		
ELECTROBOMBA					HUBO LESIÓN?		
MOTOBOMBA					SI	No	X
EXCELENTE: 1			BUENO: 2		DEFICIENTE: 3		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE INTERVENTORIA </div> </div> <p>OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM</p>							

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA					
FECHA:		28 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)		HOJA NÚMERO: 031	
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE				CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA			
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"					
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ					
PERSONAL EN OBRA						ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN	
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.		
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.		CADENERO 1		SOLEADO	X
ING. RESIDENTE OBRA	I	ORNAMENTADOR	I	CADENERO 2		SECO	
ING. DIRECTOR INTERVENT	I	CELADOR				NUBLADO	
ING. RESIDENTE INTERVENT	I	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA	
MAESTRO		AYUDANTES	3			LLUVIOSO	
OFICIALES		TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE	
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						SEÑALIZACIÓN	
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X
ACTIVIDADES DESARROLLADAS							
<p>SE CONTINUA ARMANDO LAS ESTRUCTURAS DE LA ATORRE PRINCIPAL ZONA OCCIDENTAL CON LOS ELEMENTOS PARA LA ESTRUCTURTA, TAMBIEN SE INICIA ARMANDO LOS MODULOS LONGITUDINALES TUBERIA 3" Y 2 Y 1/2" Y ANGULOS DE METALICOS.</p> <p>SE MONTAN GALAPAGOS</p>							
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						ACCIDENTES EN OBRA	
DESCRIPCIÓN		CANT.	ESTADO	OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
VOLQUETAS				SI	No		
MEZCLADORAS				HORA:			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO				NOMBRE:			
MOTOSOLDADOR		I	I	CARGO:			
PLANTA ELECTRICA		I	I	ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
ELECTROBOMBA				HUBO LESIÓN?			
MOTOBOMBA				SI	No		
EXCELENTE: I		BUENO: 2		DEFICIENTE: 3			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE INTERVENTORIA </div> </div> <p>OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM</p>							



CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA			
FECHA: 29 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)		HOJA NÚMERO: 032	
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA		
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ			
PERSONAL EN OBRA					
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.	1	CADENERO 1	
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR	1	CADENERO 2	
ING. DIRECTOR INTERVENT	1	CELADOR			
ING. RESIDENTE INTERVENT	1	ALMACENISTA			
MAESTRO		AYUDANTES	3		
OFICIALES		TOPOGRAFO			
ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN					
	A.M.	P.M.			
SOLEADO	X	X			
SECO					
NUBLADO					
LLUVIA PASAJERA					
LLUVIOSO					
LLUVIA FUERTE					
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL					
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS: X
SEÑALIZACIÓN					
CINTAS REFLECTIVAS: X	SEÑALES PREVENTIVAS: X				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS					
<p>YA TEMRINADO DEL ARMADO DE LA ESTRUCTURA DE LAS TORRES PRINCIPALES Y DE LOS MODULOS DE LA ESTRUCTURA LONGITUDINAL, ESTAS SON TRANSPORTADAS AL SITIO DONDE SERA INSTALADAS EN LAS ESTRCUTURAS DE CONCRETO ANTES CONSTRUIDAS.</p>					
					
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA					
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO			
VOLQUETAS	1	2			
MEZCLADORAS					
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO					
MOTOSOLDADOR					
PLANTA ELECTRICA					
ELECTROBOMBA					
MOTOBOMBA					
ACCIDENTES EN OBRA					
OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?					
SI	No				
HUBO LESIÓN?					
SI	No				
EXCELENTE: 1		BUENO: 2		DEFICIENTE: 3	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="text-align: center;">  RESIDENTE DE INTERVENTORIA </div> </div>					
OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PRESONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM					

CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4		DEPARTAMENTO DE CASANARE MUNICIPIO DE HATO COROZAL SECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA SOCIAL CONTROL DE OBRA BITACORA DIARIA DE OBRA				
FECHA: 30 DE MARZO/2022		LOCALIZACIÓN: CAÑO EL SAMUCO (ESCUELA EL SAMUCO)			HOJA NÚMERO: 033	
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATO COROZAL - CASANARE			CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTE SAMUCO - NIT: 901548350-4 ; R/L WILFREDO BRACA ZEA			
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 110.10.04-204 DEL 14 DICIEMBRE 2021		OBJETO: "CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE EL CAÑO EL SAMUCO EN LA VEREDA EL SAMUCO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"				
INTERVENTORIA:		SANTOVAL, STEPA & PEREZ S.A.S - NIT: 900022428-8 ; R/L GERMAN LEONARDO PEREZ LOPEZ				
PERSONAL EN OBRA						
CARGO	CANT.	CARGO	CANTIDAD	CARGO	CANT.	ESTADO DEL TIEMPO / DURACIÓN
ING. DIRECTOR OBRA		OPERADOR MAQUI.	1	CADENERO 1		SOLEADO
ING. RESIDENTE OBRA	1	ORNAMENTADOR	1	CADENERO 2		SECO
ING. DIRECTOR INTERVENT	1	CELADOR				NUBLADO
ING. RESIDENTE INTERVENT	1	ALMACENISTA				LLUVIA PASAJERA
MAESTRO		AYUDANTES	3			LLUVIOSO
OFICIALES		TOPOGRAFO				LLUVIA FUERTE
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						
CASCOS: X	BOTAS: X	GUANTES: X	GAFAS: X	CARNÉ: X	CONOS:	SEÑALIZACIÓN
						CINTAS REFLECTIVAS: X SEÑALES PREVENTIVAS: X
ACTIVIDADES DESARROLLADAS						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>SE CONTINUA CON EL TRANSPORTE DE LA ESTRUCTURA DE LAS TORRES PRINCIPALES Y DE LOS MODULOS DE LA ESTRUCTURA LONGITUDINAL.</p> <p>DISPONIBILIDAD PARA SU INSTALACIÓN Y/O MANTAJE EN TERRENO.</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  </div> </div>						
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA						
DESCRIPCIÓN	CANT.	ESTADO	ACCIDENTES EN OBRA			
VOLQUETAS	1		OCURRIÓ ALGÚN ACCIDENTE?			
MEZCLADORAS			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Si</div> <div>No</div> <div>X</div> </div>			
VIBROCOMPACTADOR CONCRETO			HORA:			
MOTOSOLDADOR			NOMBRE:			
PLANTA ELECTRICA			CARGO:			
ELECTROBOMBA			ACTIVIDAD QUE DESEMPEÑABA:			
MOTOBOMBA			HUBO LESIÓN?			
			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Si</div> <div>No</div> <div>X</div> </div>			
EXCELENTE: 1		BUENO: 2		DEFICIENTE: 3		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">  RESIDENTE DE OBRA </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  RESIDENTE DE INTERVENTORIA </div> </div> <p>OBSERVACIONES EN OBRA : ENTRADA DEL PERSONAL A LAS 7:00 AM HASTA LAS 5:00 PM</p>						
