



INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No.
110.10.01.025 del 19 febrero de 2020.

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE HATO COROZAL-CASANARE NIT: 800.012.638-2
CONTRATISTA	ANA FERNANDA SOTO DAZA
NO. IDENTIFICACIÓN	1.118.650.686 DE HATO COROZAL
VALOR DEL CONTRATO	DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$10.500.000)
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	CINCO (05) MESES
OBJETO:	REALIZAR VISITAS PARA ATENDER LA NECESIDAD DE PROYECTOS Y REALIZAR INSPECCION DE OBRAS EN PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, VIAS, ENERGIA Y EQUIPAMIENTO EN MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 DE FEBRERO DE 2020
FECHA DE INICIO	19 DE FEBRERO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	18 DE JULIO DE 2020
SUPERVISOR	EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA Secretario de Planeación y Política Sectorial
FECHA DEL PRESENTE INFORME	19 DE MARZO DE 2020
PERIODO	19/02/2020-18/03/2020

ACTIVIDADES DEL CONTRATO

1. Realizar visitas técnicas e inspección de obra en proyectos de Agua Potable y Saneamiento básico, vías, energía y equipamiento en Municipio de Hato Corozal, Casanare.
2. Realizar visitas técnicas para la identificación de las necesidades de la comunidad en cuanto a, caracterización y diagnóstico de proyectos de Agua Potable y saneamiento básico, vías, energía y equipamiento en Municipio de Hato Corozal, Casanare.
3. Realizar la inspección a las actividades que desarrolla la maquinaria a cargo del Municipio de Hato Corozal Casanare.
4. Generar informe técnico de las visitas realizadas.
5. Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor del contrato



DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES


ACTIVIDAD	DESEMPEÑO
2. Realizar visitas técnicas para la identificación de las necesidades de la comunidad en cuanto a, caracterización y diagnóstico de proyectos de Agua Potable y saneamiento básico, vías, energía y equipamiento en Municipio de Hato Corozal, Casanare.	Reunión de socialización con las comunidades de las veredas la Capilla y las Tapias sobre un suministro de afirmado con material de la zona, aproximadamente 2.363m3 y un equipo de maquinaria contemplado como carro tanque, retroexcavadora, compactador de rodillo y volqueta. Este suministro se extendió en cinco puntos críticos de la vía Hato Corozal- La Cabuya.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTIVIDAD	DESEMPEÑO
1. Realizar visitas técnicas e inspección de obra en proyectos de Agua Potable y Saneamiento básico, vías, energía y equipamiento en Municipio de Hato Corozal, Casanare.	Revisión de contratos liquidados y en ejecución, donde abarca cada una de las etapas y actividades de obra e interventoría, para así llenar la hoja de ruta con los documentos faltantes de dichos contratos y proceder a algunos archivarlos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ANA FERNANDA SOTO DAZA
INGENIERO CIVIL
ACTA PARCIAL N°1

ACTIVIDAD	DESEMPEÑO
1. Realizar visitas técnicas e inspección de obra en proyectos de Agua Potable y Saneamiento básico, vías, energía y equipamiento en Municipio de Hato Corozal, Casanare.	Registro de visita al Centro de Desarrollo Infantil CDI con el fin de inspeccionar un contrato que se ejecutó allí y tenía como fin MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL HOGAR MÚLTIPLE, (CDI DULCE ALEGRÍA) DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE. que se encuentra sin liquidar, se procede hacer las respectivas verificaciones para poder dar fin a dicho contrato.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ANA FERNANDA SOTO DAZA
INGENIERO CIVIL
ACTA PARCIAL N°1

ACTIVIDAD	DESEMPEÑO
1.Realizar visitas técnicas e inspección de obra en proyectos de Agua Potable y Saneamiento básico, vías, energía y equipamiento en Municipio de Hato Corozal, Casanare.	Registro de visita a la Inspección de Policía del municipio, con el fin de realizar una verificación de medidas y cantidades del contrato que se ejecutó allí y tenía como fin ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESSTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. Ya que se encuentra sin liquidar y se procede hacer las respectivas revisiones para poder dar fin a dicho contrato.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





ANA FERNANDA SOTO DAZA
INGENIERO CIVIL
ACTA PARCIAL N°1

ACTIVIDAD	DESEMPEÑO
3. Realizar la inspección a las actividades que desarrolla la maquinaria a cargo del Municipio de Hato Corozal Casanare.	Inspección al banco de maquinaria del municipio de Hato Corozal para evidenciar el estado en que se encuentra y las intervenciones realizadas a estas, todo ello con el fin de generar un acta de entrega de la maquinaria al almacén de la Gobernación de Casanare de los equipos en funcionamiento y lo que se encuentran en mal estado, para que estos sean devueltos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACTA DE ENTREGA DE MAQUINARIA AL ALMACEN BANCO MAQUINARIA	
FECHA: 17-09-2020	
ACTA DE ENTREGA DE MAQUINARIA AL ALMACEN DEPARTAMENTAL POR PARTE DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL.	
INFORMACION DEL EQUIPO	
DESCRIPCION EQUIPO: VOLICARITA BOLIVIANA	VALOR DE ADQUISICION: \$108.372.000.00
NO. INTERNO: 27-26	FECHA DE INGRESO: 20/10/2017
NO. MOTOR: 6461-405448	AVAILDO: 5.03 142.531.00
NO. SERIAL: 2417832277000000	
MARCA: CHEVROLET	
MODELO: FTR	
AÑO: 2007	
PLACA: 03A 061	
CARACTERISTICAS DE LAS LLANTAS: 12.00R22.5	
ESTADO DEL EQUIPO	
El vehículo no está prestando ningún servicio, debido a que algunas de sus partes se encuentran en mal estado y varias de sus piezas se han roto; también debido a falta de mantenimiento ya que la administración municipal no le ha intervenido desde que llegó; guarnición, algunas de sus piezas por su antigüedad se encuentran deterioradas. No cuenta con batería, el motor de arranque está roto y requiere reparación, las bandas de freno presionan después de un tiempo en soporte de chasis, todas las bombas se encuentran deterioradas, el stop se encuentra dañado, falta el filtro secador, varilla medidora, el tanque combustible no tiene tapa, no tiene escape renovados, el sistema de aire está roto, no tiene computadora y la sala del balancín se encuentra en el piso de la roqueta, no se pudo efectuar pruebas de funcionamiento para revisar el sistema eléctrico. En cuanto a la pintura y pintura se encuentra bueno y la telería regular.	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	



ANA FERNANDA SOTO DAZA
INGENIERO CIVIL
ACTA PARCIAL N°1

ACTIVIDAD	DESEMPEÑO
4. Generar informe técnico de las visitas realizadas.	Presentación de informe general de la maquinaria y equipos entregados al municipio por medio de un contrato de comodato N° 1552 de 2016 celebrado entre el departamento de Casanare y el municipio de Hato Corozal. Se detalla los mantenimientos preventivos y correctivos de dicha maquinaria, como también las actividades y vías intervenidas con el fin de mejorar la infraestructura vial del municipio.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



INFORMACIÓN DE INSPECCIÓN		
Tipo de maquinaria	VOLQUETA	
Marca	INTERNATIONAL	
Modelo	4700DT455	
Placa	CF27117	
Número de serie	TH230605	
Kilometraje	No visible	
Lugar de inspección	Carretera T1 N 8-46	
Fecha de inspección	Lunes 09 de Marzo de 2020	
Inspección visual		
Parte	Estado	Observación
Motor	Malo	El vehículo se encuentra en funcionamiento, pero requiere mantenimiento. Reparación del motor, arreglo de caja de dirección, cambio de neumáticos, cambio de <u>splinder</u> , soldadura de plátón y arreglo de luces
Caja	Bueno	
Sistema eléctrico	Malo	
Neumáticos	Malo	
Suspensión	Bueno	
Sistema dirección	Regular	
Sistema de frenos	Bueno	
Cabina	Bueno	
Chasis	Bueno	
Tanque combustible	Bueno	
Sistema escape	Bueno	
Estado general del vehículo	Regular	


INFORMACIÓN DE INSPECCIÓN		
Tipo de maquinaria	VOLQUETA	
Marca	INTERNATIONAL	
Modelo	4700DT455	
Placa	CF-7335	
Número de serie	TH247540	
Kilometraje	No visible	
Lugar de inspección	Carretera T1 N 8-46	
Fecha de inspección	Lunes 09 de Marzo de 2020	
Inspección visual		
Parte	Estado	Observación
Motor	Malo	El vehículo se encuentra en funcionamiento, pero requiere mantenimiento. Reparación del motor, cambio de radiador y <u>interfueller</u> , cambio de hoja segunda delantera, cambio de llantas y caucho, cambio de espárragos y <u>sellos</u> , soldadura del plástic, arreglo caja de dirección y arreglo de luces
Caja	Malo	
Sistema eléctrico	Malo	
Neumáticos	Malo	
Suspensión	Regular	
Sistema dirección	Regular	
Sistema de frenos	Bueno	
Cabina	Bueno	
Chasis	Bueno	
Llantas y rines	Malo	
Tanque combustible	Bueno	
Sistema escape	Bueno	
Estado general del vehículo	Regular	



ANA FERNANDA SOTO DAZA
INGENIERO CIVIL
ACTA PARCIAL N°1


ACTIVIDAD	DESEMPEÑO
5. Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor del contrato	Reunión sobre proyectos de vivienda y SGR. También se brindó asistencia por parte de la Gobernación de Casanare para el cierre de proyectos de la plataforma GESPROY SGR del municipio de Hato Corozal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

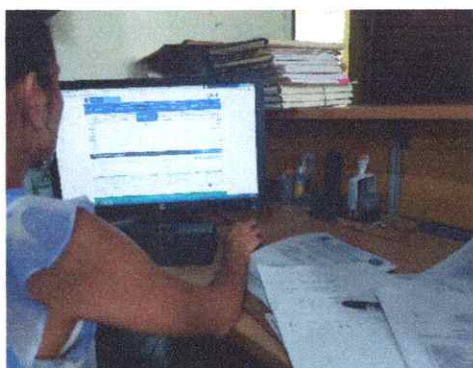

ACTIVIDAD	DESEMPEÑO
5. Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor del contrato	Reunión en la Gobernación de Casanare con la profesional responsable del aplicativo GESPROY, donde se brindó apoyo y asistencia en la plataforma, también se revisaron con detalle los proyectos sin cerrar y se suscribieron metas faltantes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

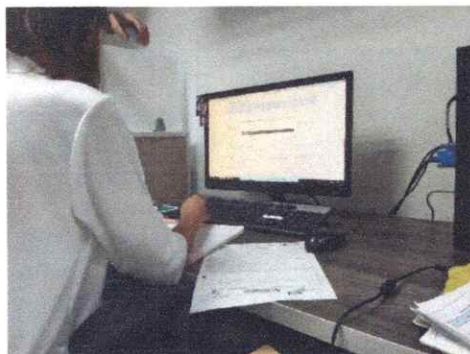



ANA FERNANDA SOTO DAZA
INGENIERO CIVIL
ACTA PARCIAL N°1

ACTIVIDAD	DESEMPEÑO
5. Las demás actividades que sean asignadas por el supervisor del contrato	<p>Seguimiento y reporte de información de los proyectos ejecutados con los recursos del SGR. En el caso del municipio de Hato Corozal se encuentran vigentes 5 proyectos a los cuales se les realiza las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ingreso de registro fotográfico de las fases inicio, ejecución y final de algunos proyectos.• Realización del reporte aprueba y envía del mes de enero y febrero del presente año.• Actualización de pólizas del contrato de obra e interventoría de algunos proyectos.• Actualización de los indicadores.• Reprogramación y verificación de fechas de terminación de los contratos de obra de dos proyectos faltantes.• Registro de pagos faltantes.• Cargue de actas de liquidación de contrato de obra e interventoría de algunos proyectos.• Cargue de certificado de requisitos proyecto nuevo CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL COLEGIO HORACIO PERDOMO VEREDA SAN JOSE DEL ARIPORO MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. que se encuentra sin ejecutar.• Elaboración del acto administrativo de cierre del proyecto CONSTRUCCION DE 28 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-DEPARTAMENTO DE CASANARE.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 28 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-DEPARTAMENTO DE CASANARE


El día 27 de mayo del 2019, se realizó la reunión de cierre del proyecto con la presencia de los señores: ANA FERNANDA SOTO DAZA, INGENIERO CIVIL, y JUAN CARLOS GARCIA, SUPERVISOR DEL CONTRATO, quienes se comprometieron a realizar el seguimiento y reporte de información de los proyectos ejecutados con los recursos del SGR.

Web application showing project status table:

ID	NOMBRE	FECHA	ESTADO	ACCIONES
1	CONSTRUCCION DE 28 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL-DEPARTAMENTO DE CASANARE	2019-05-27	CERRADO	VER DETALLE
2	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL COLEGIO HORACIO PERDOMO VEREDA SAN JOSE DEL ARIPORO MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	2019-05-27	CERRADO	VER DETALLE



ANA FERNANDA SOTO DAZA
INGENIERO CIVIL
ACTA PARCIAL N°1

<p>DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que las actividades contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.</p>	
<p>OBSERVAACIONES Y/O ANEXOS</p>	<ul style="list-style-type: none">Planilla de pago de seguridad social salud (MEDIMAS), pensión (PORVENIR), Y riesgos laborales (POSITIVA)
<p>FRIMA</p> <p>NOMBRE</p> <p>IDENTIFICACIÓN DEL</p> <p>CONTRATISTA</p>	<p></p> <p>Ana Fernanda Soto Daza CC. 1118.650.686 de Hato Corozal- Casanare</p>
