
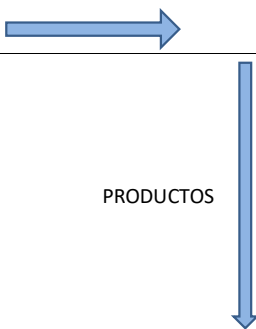

		PLAN DE CARGAS					
		INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN CASETA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA MUNICIPAL DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.					
No.	PERSONAL A INTERVENIR		1. COSTOS DE PERSONAL		2. COSTOS DIRECTOS		COSTO FINAL
			Director de interventoria: Profesional en el área de Ingeniería Ambiental y/o Ingeniero Ambiental y Sanitario y/o Ingeniero Civil, especialista con título acreditado en áreas afines (evaluación y gestión ambiental y/o aguas residuales y/o saneamiento en general), con mínimo seis (6) años de experiencia general acreditada, y de al menos cuatro (4) años de experiencia específica relacionada con, interventoría y/o construcción y/o mantenimiento de plantas de agua potable. CAT 4.	Residente de interventoria: Profesional en el área de Ingeniería Civil, con mínimo dos años de experiencia acreditada. CAT 7.	Vehículos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible.	gastos de papelería e insumos para presentación de informes	VALOR POR PRODUCTO
			MES	MES	TIEMPO DEDICACION	TIEMPO MESES	
			1	1	1	1.00	
			VALOR MES	VALOR MES	% DEDICACION	UNIDAD	
			\$ 7,268,208.00	\$ 3,634,104.00	21.00%	UND	V/TOTAL
	1	Revisión, verificación y aprobación de documentación precontractual, junto con los respectivos anexos técnicos (diseños, memoria cantidades, presupuesto, apus)	16%	2%			2,841,869.33
2	Visita de campo por parte del director de interventoria, reconociendo el estado actual de la PTAP y verificar los avances de obra	10%	1%	7%		2,310,045.82	
3	Seguimiento diario por parte del Ingeniero Residente de la interventoria y posteriormente la elaboración de reportes semanales e informe mensual.	1%	30%	5%		3,070,967.39	
4	Funciones técnicas, administrativas, financieras, contables, jurídicas y ambientales entre el tramite de actas parciales de obra y/o entrega final de obra	1%	20%			1,838,856.62	
5	Visita al lugar de la obra por parte del director de interventoria para verificar los avances de ejecución.	20%	1%	7%		3,981,733.66	
6	Liquidación del contrato de obra	1%	1%			250,753.00	
7	Seguimiento diario por parte del Ingeniero Residente de la interventoria y posteriormente la elaboración de reportes semanales e informe mensual.	1%	45%	2%	2	4,726,973.16	
TIEMPO TOTAL DEDICADO ACTIVIDAD- PROFESIONAL		50%	100%	21%	1	19,021,198.99	
RESTRICCION EN MESES		1.00	1.00			3,614,028	
PERSONAL REQUERIDO	% DEDICACION	50%	100%			22,635,227.00	
	No. Requerido	1	1				
<div> EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA Secretario de Planeacion y Política Sectorial</div>							
